

前期事業（令和３年度から令和７年度まで）の着手率について

令和７年度末時点の特定事業の進捗（見込み）状況について、「事業全体着手率」と「前期事業着手率」を用いて整理しました。

「事業全体着手率」とは、基本構想に位置づけた全事業内容のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業内容の割合を示すものです。

「前期事業着手率」とは、基本構想で定めた期間を【前期】【継続】【順次】に位置づけた事業内容のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業内容の割合を示すものです。

前期着手率の内訳について

令和７年度末時点（見込み）での前期事業着手率は９１．１％となる見込みです。

表１ 令和３年度からの前期着手率の推移

年度	R３年度	R４年度	R５年度	R６年度	R７年度
着手率(前期)	７４．４％	７８．３％	８４．７％	９０．５％	９１．１％

事業種別着手率

表２ 事業種別着手率

特定事業	全体事業数 (前期事業数*1)	R7年度末時点の事業実施状況				全体事業 着手率	前期事業 着手率
		着手済			未着手		
		完了	継続	実施中			
公共交通特定事業	41 (23) →(26)	4 → 7	17	2	15 (0)	63.4%	100%
道路特定事業	433 (198) →(239)	23 → 36	124	32 → 60	213 (19)	50.8%	90.4%
交通安全特定事業	13 (13)	0	3	10	0 (0)	100%	100%
建築物特定事業	219 (117) →(131)	26 → 35	73	5 → 10	101 (13)	53.9%	88.9%
都市公園特定事業	14 (1)	1	0	0	13 (0)	7.1%	100%
教育啓発特定事業	7 (7)	0	7	0	0 (0)	100%	100%
合計	727 (359) →(417)	54 → 79	224	49 → 82	342 (32)	53.0%	91.1%

*1 前期事業数は、「前期」のほか「継続」と「順次」も含みます。

*2 () の中の数字は、前期事業のみ集計したものです。

前期事業数の右側に赤字で記載している数字は、基本構想の計画期間を「後期・展望期・検討中」と定めている事業のうち、前倒して前期に実施している事業を加えた数となります。

また、未着手事業のかっこ内の数値は、前期事業における未着手数となります。

施設分類別着手率

表 3 施設分類別着手率

特定事業	施設分類	全体事業数 (前期事業数)		R7年度末時点の事業実施状況				全体事業 着手率	前期事業 着手率
				着手済			未着手		
				完了	継続	実施中			
公共交通特定事業	旅客施設	29	(11) →(14)	2 → 5	9	0	15 (0)	48.3%	100%
	バス	10	(10)	2	7	1	0 (0)	100%	100%
	タクシー	2	(2)	0	1	1	0 (0)	100%	100%
道路特定事業	国道	13	(6) →(7)	2 → 3	4	0	6 (0)	53.8%	100%
	県道	28	(11) →(13)	0 → 1	9	1 → 2	16 (1)	42.9%	90.9%
	市道	351	(152) →(184)	12→21	103	21→44	183 (16)	47.9%	89.5%
	駅前交通広場	41	(29) →(35)	9 → 11	8	10→14	8 (2)	80%	93.1%
交通安全特定事業	－	13	(13)	0	3	10	0 (0)	100%	100%
建築物特定事業	公共・公益施設	136	(68) →(78)	19→25	37	4 → 8	66 (8)	51.5%	88.2%
	保健・福祉施設	28	(15)	3 →	12	0	13 (0)	53.6%	100%
	医療施設	15	(7) →(8)	2	4	1 → 2	7 (0)	53.3%	100%
	商業施設	40	(27) →(30)	2 → 5	20	0	15 (5)	63%	81.5%
都市公園特定事業	公園・緑地	14	(1)	1	0	0	13 (0)	7.1%	100%
教育啓発特定事業	－	7	(7)	0	7	0	0 (0)	100%	100%
合計		727	(359) →(417)	54→79	224	49→82	342 (32)	53.0%	91.1%

事業項目別着手率

表 4 事業項目別着手率

特定事業	事業項目	全体事業数 (前期事業数)	R7年度末時点の事業実施状況				全体事業 着手率	前期事業 着手率
			着手済			未着手		
			完了	継続	実施中			
公共交通特定事業	施設整備（ホーム・改札口等）	17（ 5 ）→(8)	2→5	1	2	9（0）	47.1%	100%
	案内設備	11（ 5 ）	2	3	0	6（0）	45.5%	100%
	人的対応・心のバリアフリー	13（ 13 ）	0	13	0	0（0）	100%	100%
道路特定事業	施設整備（歩道・バス停留所等）	298（ 69 ）→(110)	20→33	0	31→59	206（18）	30.9%	73.9%
	案内設備	9（ 3 ）	1	0	1	7（1）	22%	66.7%
	安全対策・維持管理	121（ 121 ）	2	119	0	0（0）	100%	100%
	教育啓発・心のバリアフリー	5（ 5 ）	0	5	0	0（0）	100%	100%
交通安全特定事業	横断歩道・信号機	7（ 7 ）	0	0	7	0（0）	100%	100%
	安全対策・維持管理	4（ 4 ）	0	1	3	0（0）	100%	100%
	教育啓発・心のバリアフリー	2（ 2 ）	0	2	0	0（0）	100%	100%
建築物特定事業	施設整備（通路・トイレ等）	112（ 42 ）→(52)	20→26	12	2→6	68（8）	39.3%	81.0%
	駐車場	16（ 5 ）→(6)	1	1	0→1	13（3）	18.8%	40.0%
	案内設備	33（ 12 ）→(15)	5→8	2	3	20（2）	39.4%	83.3%
	人的対応・心のバリアフリー	58（ 58 ）	0	58	0	0（0）	100%	100%
都市公園特定事業	施設整備（園路・トイレ等）	11（ 1 ）	1	0	0	10（0）	9.1%	100%
	案内設備	3（ 0 ）	0	0	0	3（0）	-	-
教育啓発特定事業	障がい理解の周知・啓発	4（ 4 ）	0	4	0	0（0）	100%	100%
	学校教育活動での教育啓発	1（ 1 ）	0	1	0	0（0）	100%	100%
	体験・学習による教育啓発の機会の創出	2（ 2 ）	0	2	0	0（0）	100%	100%
合計		727（ 359 ）→(417)	54→79	224	49→82	342（32）	53.0%	91.1%

表2、表3、表4の前期事業着手率をグラフにしたのが次の図となります。

グラフの左側が令和6年度末まで、右側が令和7年度末（見込み）までの進捗率を表しています。

表2 事業種別着手率(前期事業着手率)

(単位: %)

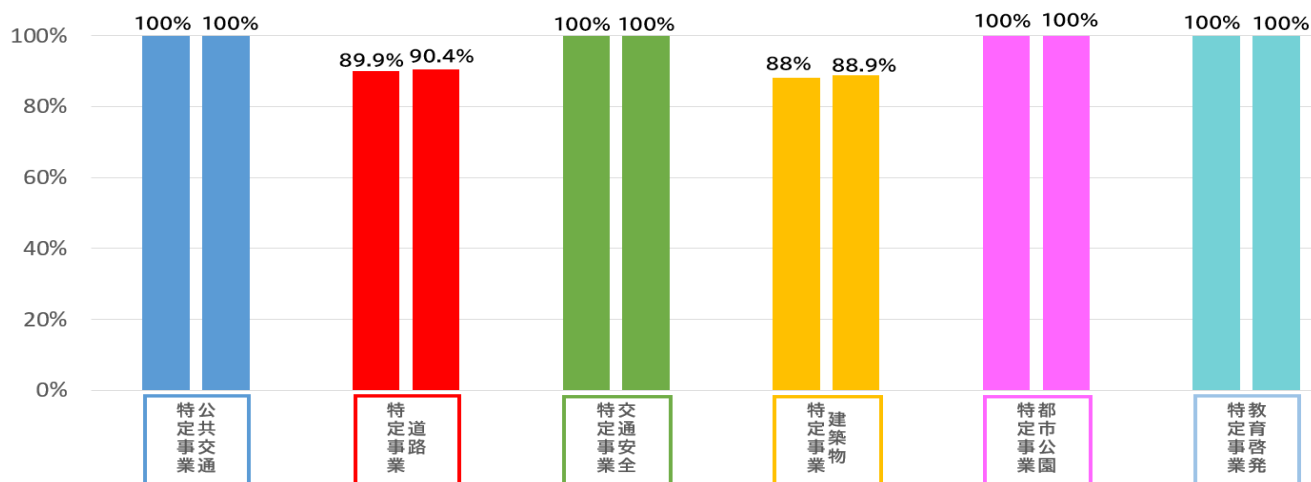


表3 施設分類着手率(前期事業着手率)

(単位: %)

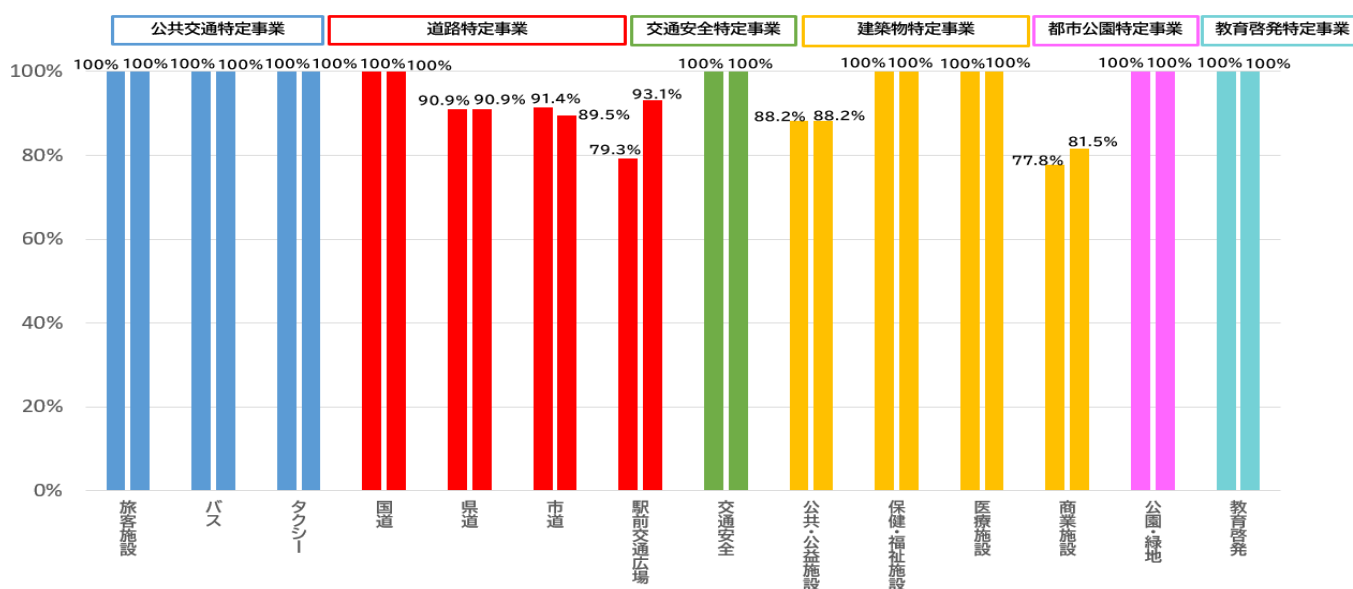


表4 事業分類着手率(前期事業着手率)

(単位: %)

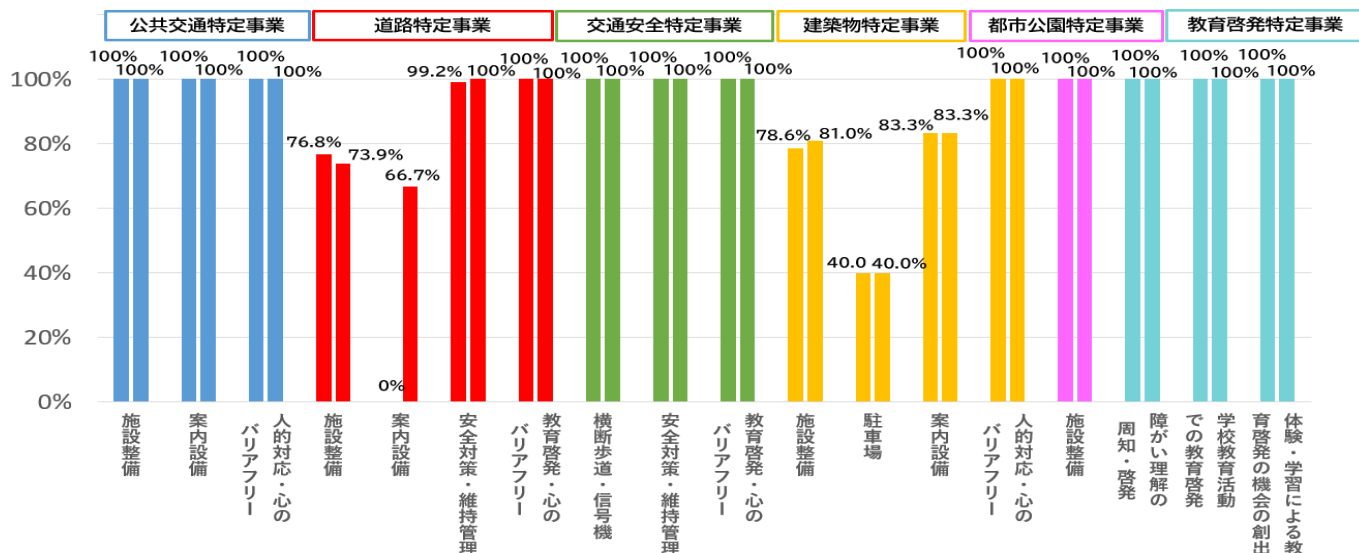


図1 表2、表3、表4の前期事業着手率を表したグラフ
