

特定事業計画の進捗管理について

1 特定事業計画の整理

(1) 特定事業

戸田市バリアフリー基本構想（以下「基本構想」という。）では、基本構想 17 ページのとおり市内の 3 駅周辺を重点整備地区として定めており、表 1 に示した 6 つの特定事業については、事業箇所ごとに具体的な事業を設定しています。

表 1 特定事業種別事業数

特定事業種別	事業数	事業者	事業箇所
1. 公共交通特定事業	7	東日本旅客鉄道株式会社	市内 3 駅
		国際興業株式会社	路線バス、tocoバス(美笹循環以外)
		埼京タクシー株式会社	tocoバス(美笹循環)、タクシー
2. 道路特定事業	67	国	国道 298 号 国道 17 号
		埼玉県	県道 3 路線
		戸田市	市道（58 路線）、 駅前交通広場（4 箇所）
		埼玉県公安委員会、蕨警察署	重点整備地区内主要経路等
4. 建築物特定事業	20	戸田市	公共施設（14 施設）
		民間事業者等	民間施設（6 施設）
5. 都市公園特定事業	2	戸田市	後谷公園、北部公園
6. 教育啓発特定事業	1	戸田市	市民、市内小中学生、市職員等
合計	98	-	-

事業箇所ごとの具体的な事業は、図 1 のように基本構想 34 ページから 92 ページにかけて掲載しており、計 98 事業あります。

図 1 【公共・公益施設 - 2】戸田公園駅行政センターの一部抜粋

事業主体		戸田市		
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針				
当施設は、建築当時のバリアフリー化に対応していたが、時代の変化とともに追加の整備が必要となっている。自主点検等により、即座に整備できるものは修繕で対応してきたが、大掛かりなものについては将来大規模修繕工事が発生した際に整備する予定である。				
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）				
事業内容・実施時期				
項目	事業内容	実施時期		
		前期	後期	展望期
出入口・敷地内通路	1 階出入口の段差における注意喚起の実施	■		
トイレ	2 階トイレへのベビーチェア設置検討	■		
案内設備	ピクトグラムによるバリアフリー設備の情報提供の充実	■		
	バリアフリールートなどがわかりやすい施設の全体案内図の設置	■		
	緊急情報を文字で提供するためのモニターなどの設置		■	

(2) 特定事業計画

(1) で挙げた 98 事業については、それぞれの事業において事業内容と基本構想で定めた期間を各事業者を設定していただきました。今年度は、事業主体である事業者にも図 2 のように事業内容の具体的な実施期間と令和 3 年度の実施状況を示した特定事業計画を作成していただいています。

図 2 戸田公園駅行政センター特定事業計画の一部抜粋

事業内容	基本構想で定めた期間	具体的な実施期間													
		前期						後期						展望期	
		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13~			
1階出入口の段差における注意喚起の実施	前期	計画 実施	未着手												
2階トイレへのベビーチェア設置検討	前期	計画 実施	実施中												
ピクトグラムによるバリアフリー設備の情報提供の充実	前期	計画 実施	未着手												
バリアフリールートなどがわかりやすい施設の全体案内図の設置	前期	計画 実施	完了												
緊急情報を文字で提供するためのモニターなどの設置	後期	計画 実施	未着手												

(3) 事業内容の整理

基本構想では、「前期」・「後期」・「展望期」・「継続」・「順次」・「検討中」の 6 つの実施期間（基本構想で定めた期間）を設けています。事業内容の件数を実施期間ごとに整理したものが表 3 となります。

表 3 実施期間（基本構想で定めた期間）ごとの事業内容数

前期 【R3-7年度】	後期 【R8-12年度】	展望期 【R13年度~】	継続	順次	検討中	合計
128	109	249	219	12	10	727

なお、事業内容の中には、図 3 のように基本構想で定めた期間が「前期・後期」や「後期・展望期」と期間がまたがって設定されている事業もあります。

「前期・後期」と設定されている場合は前期に 1 件、後期に 1 件と別々に計上しています。「後期・展望期」でも同様の方法で計上をしています。

図 3 市道第 7052 号線特定事業計画の一部抜粋

事業内容	基本構想で定めた期間
セミフラット構造を基本とした横断勾配が小さい歩道の整備	前期 後期

2 特定事業計画の進捗管理

令和3年度末時点の特定事業の進捗状況について、「事業全体着手率」と「前期事業着手率」を用いて整理しました。基本構想の計画期間は令和3年度から令和12年度までとなっていますので、前期事業着手率100%を目標に、今後の進捗管理をしていきます。

「事業全体着手率」とは、基本構想に位置づけた全事業内容のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業内容の割合を示すものです。

「前期事業着手率」とは、基本構想で定めた期間を【前期】【継続】【順次】に位置づけた事業内容のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業内容の割合を示すものです。

なお、基本構想で【前期】に位置づけられている事業の場合、事業者は令和3年度から7年度までの間で具体的な実施期間を設定することになりますが、前期に実施できない事情が生じ、具体的な実施期間が後期や展望期となった事業があります。この場合でも、前期事業着手率は基本構想で定めた期間がもとになるため、前期事業数に変更はありません。

また、基本構想で【後期】【展望期】【検討中】となっている事業が、前期（令和3年度から令和7年度まで）に前倒して実施された場合（実施状況が完了または実施中となる場合）、前期事業着手率が100%を超えることがあります。

(1) 事業種別着手率

特定事業計画の初年度の実績となるが、全ての特定事業において前期事業着手率は70%を超える数字となっており、計画的に事業を進められていることがわかる。

表4 事業種別着手率

特定事業	全体事業数 (前期事業数*1)	R3年度末時点の事業実施状況				全体事業 着手率	前期事業 着手率
		完了	継続	実施中	未着手		
公共交通特定事業	41 (23)	2	19	1	19	53.7%	95.7%
道路特定事業	433 (198)	17	120	11	285	34.2%	74.7%
交通安全特定事業	13 (13)	0	3	10	0	100.0%	100.0%
建築物特定事業	219 (117)	14	67	11	127	42.0%	78.6%
都市公園特定事業	14 (1)	1	0	0	13	7.1%	100.0%
教育啓発特定事業	7 (7)	0	7	0	0	100.0%	100.0%
合計	727 (359)	34	216	33	444	38.9%	78.8%

*1 前期事業数は、「前期」のほか「継続」と「順次」も含まれます。

(2) 施設分類別着手率

建築物特定事業の医療施設の前期事業着手率については、展望期に実施する予定であった事業を令和3年度から取り組んでいるため、着手率が100%を超えている。

表5 施設分類別着手率

特定事業	施設分類	全体事業数 (前期事業数)	R3年度末時点の事業実施状況				全体事業 着手率	前期事業 着手率
			完了	継続	実施中	未着手		
公共交通特定事業	旅客施設	29 (11)	0	11	0	18	37.9%	100.0%
	バス	10 (10)	2	7	0	1	90.0%	90.0%
	タクシー	2 (2)	0	1	1	0	100.0%	100.0%
道路特定事業	国道	13 (6)	0	3	0	10	23.1%	50.0%
	県道	28 (11)	0	6	0	22	21.4%	54.5%
	市道	351 (152)	11	103	11	226	35.6%	82.2%
	駅前交通広場	41 (29)	6	8	0	27	34.1%	48.3%
交通安全特定事業	—	13 (13)	0	3	10	0	100.0%	100.0%
建築物特定事業	公共・公益施設	136 (68)	7	35	8	86	36.8%	73.5%
	保健・福祉施設	28 (15)	2	11	0	15	46.4%	86.7%
	医療施設	15 (7)	1	4	3	7	53.3%	114.3%
	商業施設	40 (27)	4	17	0	19	52.5%	77.8%
都市公園特定事業	公園・緑地	14 (1)	1	0	0	13	7.1%	100.0%
教育啓発特定事業	—	7 (7)	0	7	0	0	100.0%	100.0%
合計		727 (359)	34	216	33	444	38.9%	78.8%

(3) 事業項目別着手率


施設整備や案内設備等は、予定している実施時期の関係から、令和3年度の前期事業着手率は低い数値となっている。

表6 事業項目別着手率

特定事業	事業項目	全体事業数 (前期事業数)	R3年度末時点の事業実施状況				全体事業 着手率	前期事業 着手率
			完了	継続	実施中	未着手		
公共交通特定事業	施設整備(ホーム・改札口等)	17 (5)	0	3	1	13	23.5%	80.0%
	案内設備	11 (5)	2	3	0	6	45.5%	100.0%
	人的対応・心のバリアフリー	13 (13)	0	13	0	0	100.0%	100.0%
道路特定事業	施設整備(歩道・バス停留所等)	298 (69)	17	0	10	265	9.1%	39.1%
	案内設備	8 (3)	0	0	1	13	12.5%	33.3%
	安全対策・維持管理	121 (121)	0	119	0	2	98.3%	98.3%
	教育啓発・心のバリアフリー	5 (5)	0	1	0	4	20.0%	20.0%
交通安全特定事業	横断歩道・信号機	8 (7)	0	0	7	1	87.5%	100.0%
	安全対策・維持管理	4 (4)	0	1	3	0	100.0%	100.0%
	教育啓発・心のバリアフリー	2 (2)	0	2	0	0	100.0%	100.0%
建築物特定事業	施設整備(通路・トイレ等)	112 (42)	10	11	7	84	25.0%	66.7%
	駐車場	16 (5)	0	1	1	14	12.5%	40.0%
	案内設備	33 (12)	4	2	3	24	27.3%	75.0%
	人的対応・心のバリアフリー	58 (58)	0	53	0	5	91.4%	91.4%
都市公園特定事業	施設整備(園路・トイレ等)	11 (1)	1	0	0	10	9.1%	100.0%
	案内設備	3 (0)	0	0	0	3	0.0%	—
教育啓発特定事業	障がい理解の周知・啓発	4 (4)	0	4	0	0	100.0%	100.0%
	学校教育活動での教育啓発	1 (1)	0	1	0	0	100.0%	100.0%
	体験・学習による教育啓発の機会の創	2 (2)	0	2	0	0	100.0%	100.0%
合計		727 (359)	34	216	33	444	38.9%	78.8%

表4、表5、表6の前期事業着手率をグラフにしたのが次の図となります。

図4 表4、表5、表6の前期事業着手率を表したグラフ

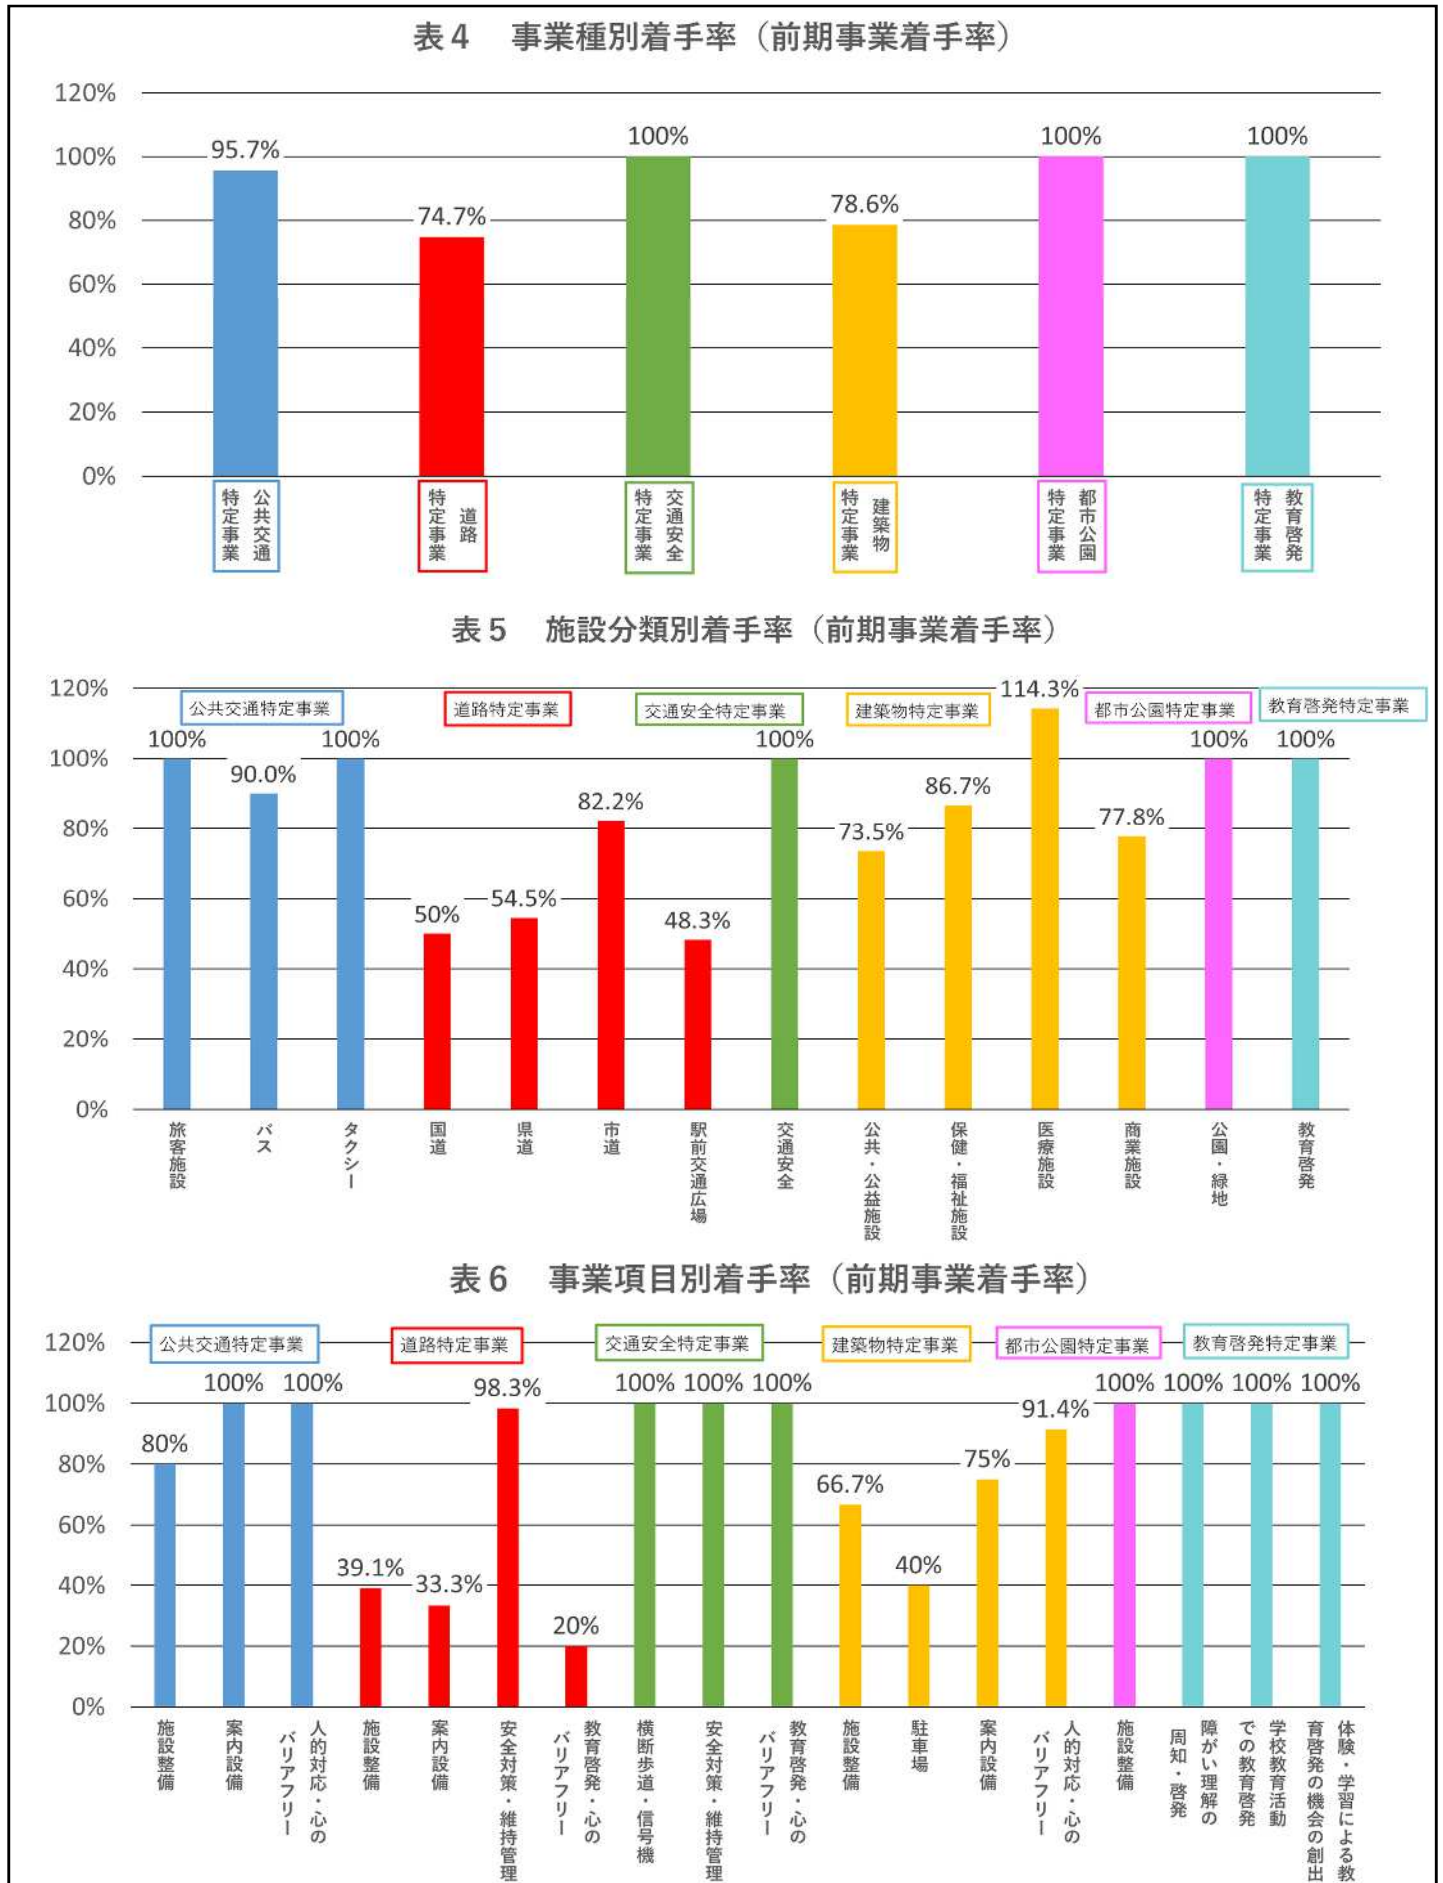

3 主な完了事業(令和3年度)

特定事業	事業主体・事業内容
<p>公共交通 特定事業</p>	<p>路線バス 事業主体：国際興業株式会社 事業内容：多様な利用者を想定した案内表示の充実</p> <p>(基本構想 36 ページ) (参考資料 2 ページ)</p> 
<p>道路 特定事業</p>	<p>路線番号 23 戸田駅西口駅前通り線 事業主体：戸田市 事業内容：歩道の整備、視覚障害者誘導用ブロックの設置</p> <p>(基本構想 19 ページ、53 ページ) (参考資料 12 ページ)</p> 
<p>建築物 特定事業</p>	<p>戸田市役所 事業主体：戸田市 事業内容：赤ちゃん休憩室の案内の充実</p> <p>(基本構想 75 ページ) (参考資料 26 ページ)</p>  
	<p>戸田公園駅前行政センター 事業主体：戸田市 事業内容：全体案内図の設置、貸出用車いすの用意</p> <p>(基本構想 76 ページ) (参考資料 27 ページ)</p>  

建築物
特定事業
(続き)

上戸田地域交流センター
(あいパル)
事業主体：戸田市
事業内容：着替え台の設置
(基本構想 77 ページ)
(参考資料 27 ページ)



中央図書館・郷土博物館
事業主体：戸田市
事業内容：受付に耳マーク等の掲示
(基本構想 80 ページ)
(参考資料 29 ページ)



生涯学習施設 (芦原小学校内)
事業主体：戸田市
事業内容：受付に耳マーク等の掲示
(基本構想 81 ページ)
(参考資料 29 ページ)



心身障害者福祉センター 事業主体：戸田市
事業内容：受付に耳マーク等の掲示、借りやすい位置に貸出用車いすを設置
(基本構想 84 ページ)
(参考資料 32 ページ)



戸田中央総合病院
事業主体：医療法人社団東光会
事業内容：車いすが安全に待機できる
待合スペースの確保
(基本構想 86 ページ)
(参考資料 33 ページ)

