

議題 1 特定事業計画の進捗管理について

1 特定事業計画の整理

(1) 特定事業

戸田市バリアフリー基本構想（以下「基本構想」という。）では、基本構想 17 ページのとおり市内の 3 駅周辺を重点整備地区として定めており、表 1 に示した 6 つの特定事業については、事業箇所ごとに具体的な事業を設定しています。

表 1 特定事業種別事業数

特定事業種別	事業数	事業者	事業箇所
1. 公共交通特定事業	7	東日本旅客鉄道株式会社	市内 3 駅
		国際興業株式会社	路線バス、t o c o バス(美笹循環以外)
		埼玉タクシー株式会社	t o c o バス(美笹循環)、タクシー
2. 道路特定事業	67	国	国道 298 号
			国道 17 号
		埼玉県	県道 3 路線
		戸田市	市道（58 路線）、駅前交通広場（4 箇所）
3. 交通安全特定事業	1	埼玉県公安委員会、蕨警察署	重点整備地区内主要経路等
4. 建築物特定事業	20	戸田市	公共施設（14 施設）
		民間事業者等	民間施設（6 施設）
5. 都市公園特定事業	2	戸田市	後谷公園、北部公園
6. 教育啓発特定事業	1	戸田市	市民、市内小中学生、市職員等
合計	98	-	-

事業箇所ごとの具体的な事業は、図 1 のように基本構想 34 ページから 92 ページにかけて掲載しており、計 98 事業あります。

事業主体	戸田市			
施設の現状とバリアフリー化の今後の方針				
当施設は、建築当時のバリアフリー化に対応していたが、時代の変化とともに追加の整備が必要となっている。自主点検等により、即座に整備できるものは修繕で対応してきたが、大掛かりなものについては将来大規模修繕工事が発生した際に整備する予定である。				
バリアフリー設備等の状況（整備済みの項目を記載）				
				
事業内容・実施時期				
項目	事業内容	実施時期		
		前期	後期	展望期
出入口・敷地内通路	1 階出入口の段差における注意喚起の実施			
トイレ	2階トイレへのベビーチェア設置検討			
案内設備	ピクトグラムによるバリアフリー設備の情報提供の充実			
	バリアフリールートなどがわかりやすい施設の全体案内図の設置			
	緊急情報を文字で提供するためのモニターなどの設置			

図 1 【公共・公益施設 - 2】戸田公園駅行政センター 一部抜粋（基本構想 P.76）

(2) 特定事業計画

(1) で挙げた 98 事業については、それぞれの事業において事業内容と基本構想で定めた期間を各事業者に設定していただいております。今年度は、事業主体である事業者に図 2 のように令和 6 年度の実施状況を示した特定事業計画の進捗状況を報告していただいております。

事業内容	基本構想で定めた期間	具体的な実施期間											
		前 期						後 期					
		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13~	
障がい者用駐車スペースの屋根の設置	展望期	計画											
	実施	未着手	未着手	未着手	未着手								
駐車場の排水不良の解消	展望期	計画											
	実施	未着手	実施中	実施中	実施中								
緊急情報を文字で提供するためのモニターなどの設置	後期	計画											
	実施	実施中	完了										
受付や窓口における耳マーク等の掲示	前期	計画											
	実施	完了											
授乳室におけるお湯の入手方法の掲示	展望期	計画											
	実施	未着手	未着手	未着手	未着手								

図 2 中央図書館・郷土博物館 一部抜粋

(3) 事業内容の整理

基本構想 31 ページにおいて、「前期」・「後期」・「展望期」・「継続」・「順次」・「検討中」の実施時期(基本構想で定めた期間)を設けており、基本構想 34 ページから 92 ページまでにおいて、各事業の特定事業計画を定めています。

事業内容の件数を実施時期ごとに整理したものが表 2 となります。

表 2 実施時期(基本構想で定めた期間)ごとの事業内容数

前期 【R3-7年度】	後期 【R8-12年度】	展望期 【R13年度~】	継続	順次	検討中	合計
128	109	249	219	12	10	727

「検討中」の事業については、後期計画の実施に伴い、事業者と調整のうえ計画期間の整理・見直しを行います。

なお、事業内容の中には、図 3 のように基本構想で定めた期間が「前期・後期」や「後期・展望期」と期間がまたがって設定されている事業もあります。

「前期・後期」と設定されている場合は前期に 1 件、後期に 1 件と別々に計上しています。「後期・展望期」でも同様の方法で計上をしています。

事業内容	基本構想で定めた期間
セミフラット構造を基本とした横断勾配が小さい歩道の整備	前期 後期

図 3 市道第 7052 号線特定事業計画 一部抜粋 (P.53・54)

2 特定事業計画の進捗状況

令和6年度末時点の特定事業の進捗状況について、「事業全体着手率」と「前期事業着手率」を用いて整理しました。基本構想の計画期間は令和3年度から令和12年度まで（前期が令和3年度から令和7年度まで、後期が令和8年度から令和12年度まで）となっていますので、前期・後期事業ともに着手率100%を目標に、引き続き進捗管理をしていきます。

「事業全体着手率」とは、基本構想に位置づけた全事業内容のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業内容の割合を示すものです。

「前期事業着手率」とは、基本構想で定めた期間を【前期】【継続】【順次】に位置づけた事業内容のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業内容の割合を示すものです。

(1) 事業種別着手率

- 令和6年度末時点での前期事業着手率は90.5%となっており、令和5年度末時点での着手率84.7%から約5.8%の進捗が確認できました。

表3 令和3年度からの前期着手率の推移

年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
着手率(前期)	74.4%	78.3%	84.7%	90.5%	

表4 事業種別着手率

特定事業	全体事業数 (前期事業数*1)	R6年度末時点の事業実施状況				全体事業 着手率	前期事業 着手率
		着手済			未着手		
		完了	継続	実施中			
公共交通特定事業	41 (23) →(26)	4 → 7	17	2	15 (0)	63.4%	100%
道路特定事業	433 (198) →(214)	16 → 27	124	38 → 43	239 (20)	44.8%	89.9%
交通安全特定事業	13 (13)	0	3	10	0 (0)	100%	100%
建築物特定事業	219 (117) →(128)	23 → 30	73	7 → 11	105 (14)	52.1%	88%
都市公園特定事業	14 (1)	1	0	0	13 (0)	7.1%	100%
教育啓発特定事業	7 (7)	0	7	0	0 (0)	100%	100%
合計	727 (359) →(389)	44 → 65	224	57 → 66	372 (34)	48.8%	90.5%

*1 前期事業数は、「前期」のほか「継続」と「順次」も含まれます。

*2 () の中の数字は、前期事業のみ集計したものです。

前期事業数の右側に赤字で記載している数字は、基本構想の計画期間を「後期・展望期・検討中」と定めている事業のうち、前倒しで前期に実施している事業を加えた数となります。

また、未着手事業のかっこ内の数値は、前期事業における未着手数となります。

(2) 施設分類別着手率

- 道路特定事業の市道、駅前交通広場や建築物特定事業の公共・公益施設、商業施設については、予定している実施時期の関係から、前期での未着手が見受けられるが概ね計画通り進んでいる。

表5 施設分類別着手率

特定事業	施設分類	全体事業数 (前期事業数)	R6年度末時点の事業実施状況				全体事業 着手率	前期事業 着手率
			着手済			未着手		
			完了	継続	実施中			
公共交通特定事業	旅客施設	29 (11) → (14)	2 → 5	9	0	15 (0)	48.3%	100%
	バス	10 (10)	2	7	1	0 (0)	100%	100%
	タクシー	2 (2)	0	1	1	0 (0)	100%	100%
道路特定事業	国道	13 (6) → (7)	2	4	0 → 1	6 (0)	53.8%	100%
	県道	28 (11) → (13)	0	9	1 → 3	16 (1)	42.9%	90.9%
	市道	351 (152) → (163)	7 → 16	103	29 → 31	201 (13)	42.7%	91.4%
	駅前交通広場	41 (29) → (31)	7 → 9	8	8	16 (6)	61%	79.3%
交通安全特定事業	-	13 (13)	0	3	10	0 (0)	100%	100%
建築物特定事業	公共・公益施設	136 (68) → (75)	17 → 21	37	6 → 9	69 (8)	49.3%	88.2%
	保健・福祉施設	28 (15)	3	12	0	13 (0)	53.6%	100%
	医療施設	15 (7) → (8)	2	4	1 → 2	7 (0)	53.3%	100%
	商業施設	40 (27) → (30)	1 → 4	20	0	16 (6)	60%	77.8%
都市公園特定事業	公園・緑地	14 (1)	1	0	0	13 (0)	7.1%	100%
教育啓発特定事業	-	7 (7)	0	7	0	0 (0)	100%	100%
合計		727 (359) → (389)	44 → 65	224	57 → 66	372 (34)	48.8%	90.5%

(3) 事業項目別着手率

- 施設整備や案内設備等は、予定している実施時期の関係から前期での未着手が見受けられるが、概ね計画通り進んでいる。

表6 事業項目別着手率

特定事業	事業項目	全体事業数 (前期事業数)	R6年度末時点の事業実施状況				全体事業 着手率	前期事業 着手率
			着手済			未着手		
			完了	継続	実施中			
公共交通特定事業	施設整備（ホーム・改札口等）	17（5）→(8)	2→5	1	2	9（0）	47.1%	100%
	案内設備	11（5）	2	3	0	6（0）	45.5%	100%
	人的対応・心のバリアフリー	13（13）	0	13	0	0（0）	100%	100%
道路特定事業	施設整備（歩道・バス停留所等）	298（69）→(85)	15→26	0	38→43	229（16）	23.2%	76.8%
	案内設備	9（3）	0	0	0	9（3）	0%	0%
	安全対策・維持管理	121（121）	1	119	0	1（1）	99.2%	99.2%
	教育啓発・心のバリアフリー	5（5）	0	5	0	0（0）	100%	100%
交通安全特定事業	横断歩道・信号機	7（7）	0	0	7	0（0）	100.0%	100%
	安全対策・維持管理	4（4）	0	1	3	0（0）	100%	100%
	教育啓発・心のバリアフリー	2（2）	0	2	0	0（0）	100%	100%
建築物特定事業	施設整備（通路・トイレ等）	112（42）→(49)	19→23	12	2→5	72（9）	35.7%	78.6%
	駐車場	16（5）→(6)	1	1	0→1	13（3）	18.8%	40%
	案内設備	33（12）→(15)	3→6	2	5	20（2）	39.4%	83.3%
	人的対応・心のバリアフリー	58（58）	0	58	0	0（0）	100%	100%
都市公園特定事業	施設整備（園路・トイレ等）	11（1）	1	0	0	10（0）	9.1%	100%
	案内設備	3（0）	0	0	0	3（0）	-	-
教育啓発特定事業	障がい理解の周知・啓発	4（4）	0	4	0	0（0）	100%	100%
	学校教育活動での教育啓発	1（1）	0	1	0	0（0）	100%	100%
	体験・学習による教育啓発の機会の創出	2（2）	0	2	0	0（0）	100%	100%
合計		727（359）→(389)	44→65	224	57→66	372（34）	48.8%	90.5%

表4、表5、表6の前期事業着手率をグラフにしたのが次の図となります。

グラフの左側が令和5年度末まで、右側が令和6年度末までの進捗率を表しています。

表4 事業種別着手率(前期事業着手率)

(単位: %)

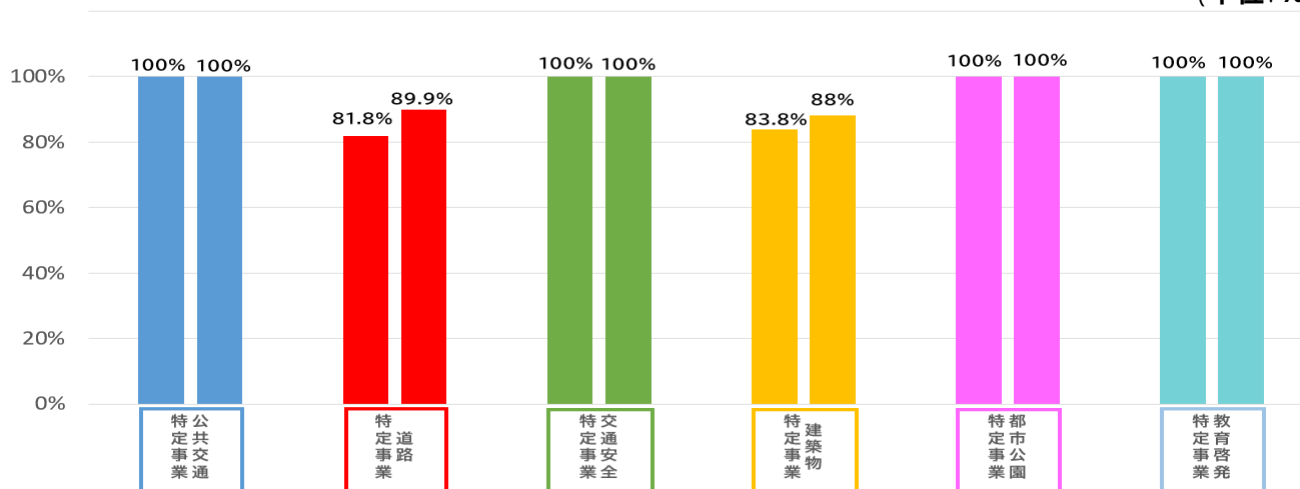


表5 施設分類着手率(前期事業着手率)

(単位: %)

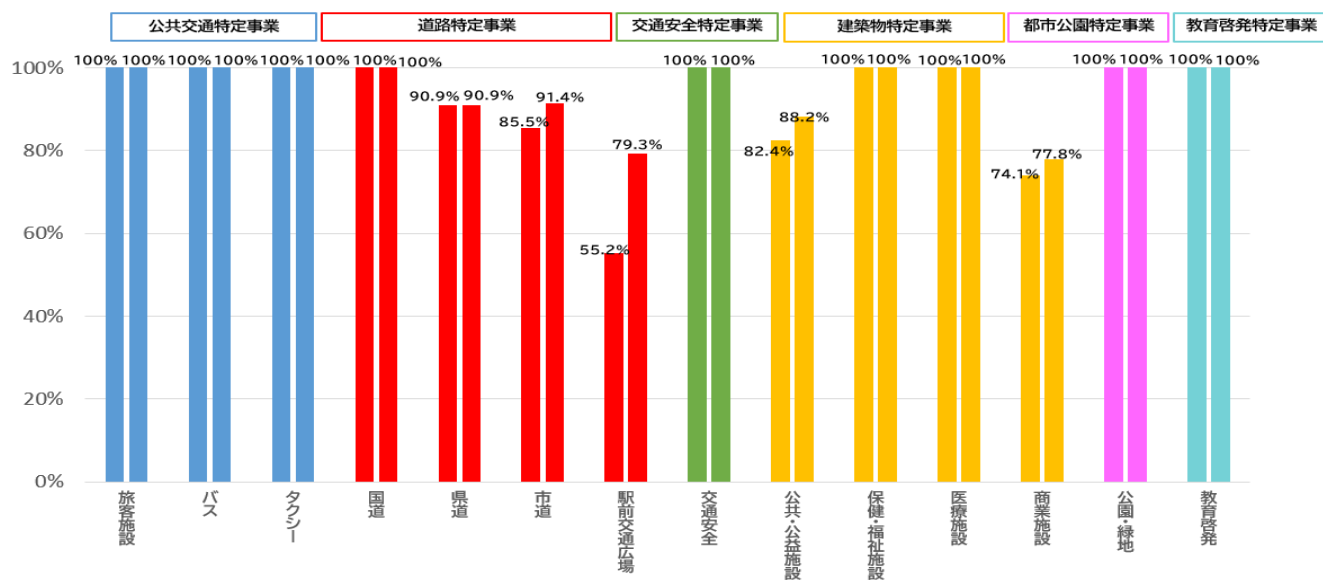


表6 事業分類着手率(前期事業着手率)

(単位: %)

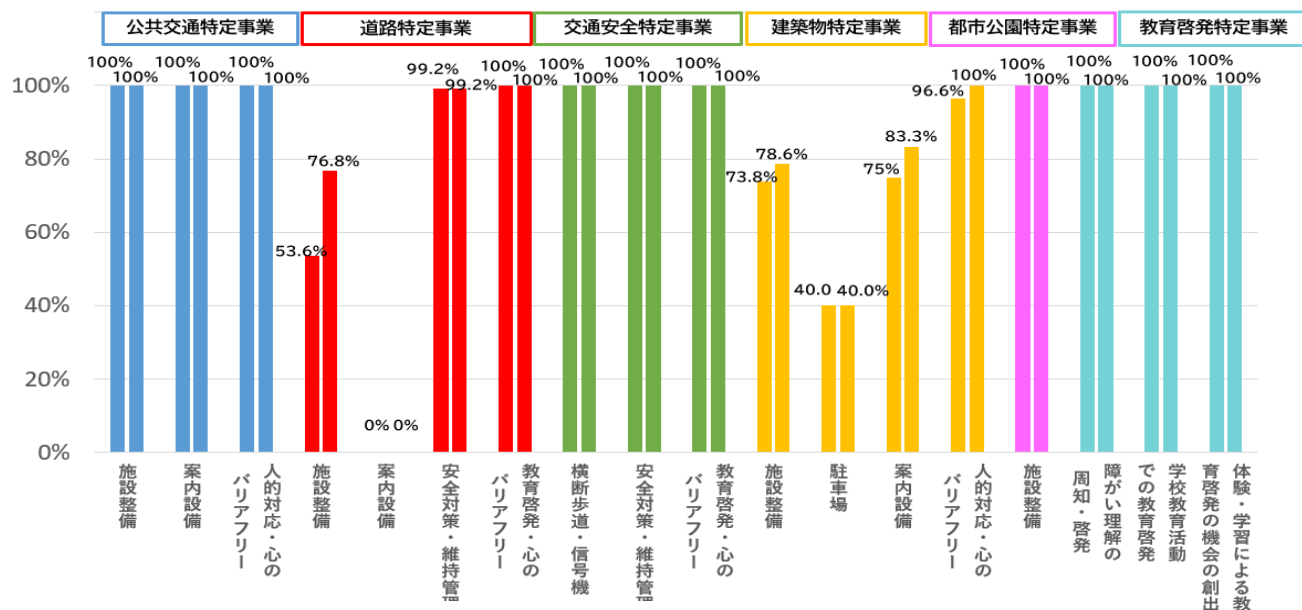
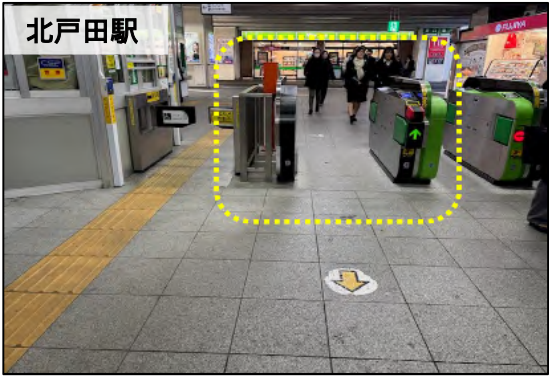


図4 表4、表5、表6の前期事業着手率を表したグラフ

3 主な完了事業(令和6年度)

特定事業	事業主体・事業内容
公共交通 特定事業	旅客施設 1～3 北戸田駅、戸田駅、戸田公園駅 事業主体：東日本旅客鉄道株式会社 事業内容：有人改札口以外の自動改札機に、車いすやベビーカー利用者に配慮した拡幅改札の設置 (基本構想 34～35 ページ) 北戸田駅  戸田駅  戸田公園駅 
交通安全 特定事業	市内横断歩道等 事業主体：埼玉県公安委員会 埼玉県蕨警察署 事業内容：音響式や経過時間表示式等のバリアフリー対応信号機の導入を推進 (基本構想 74 ページ) <u>設置箇所については【資料1-2】のとおり</u> 市内横断歩道等 事業主体：埼玉県公安委員会 埼玉県蕨警察署 事業内容：歩行者用信号の青時間が短い信号機において、時間調整や青延長用押しボタンの設置を検討 (基本構想 74 ページ) <u>実施箇所について【資料1-2】のとおり</u>

道路 特定事業	路線番号 34 第 2037 号線 事業主体：戸田市 事業内容：車止めの視認性向上及び衝突を避けた動線への誘導用ブロックの設置 (基本構想 59 ページ)   
建築物 特定事業	戸田市役所 事業主体：戸田市 事業内容：● 出入口・敷地内通路 (1) 出入口付近に屋根のある車寄せの設置 (2) 輝度比が確保された誘導用ブロックの整備 (3) 誘導用ブロックの位置のグレーチングを目の細かいものに交換 ● トイレ (4) 介助が必要な大人等が利用可能な大型ベッドの設置 (5) 視覚障がい者等にも認識しやすいようトイレ内の配色に留意 ● 駐車場 (6) 障がい者用駐車ますにおける屋根の設置 (基本構想 75、76 ページ) (1)   (2)  

建築物
特定事業
(続き)

(3)



(4)



(5)



(6)



中央図書館・郷土博物館

事業主体：戸田市

事業内容：動線上の排水溝やグレーチングはマス目の細かいものを採用

(基本構想 80 ページ)



建築物
特定事業
(続き)

戸田中央総合病院

事業主体：医療法人社団東光会

事業内容：受付や窓口における筆談用具の設置と耳マーク等の掲示
(基本構想 86、87 ページ)

・ 耳マークの設置



・ 補助犬同伴可能の案内設置



教育啓発 特定事業	心のバリアフリー 事業主体：戸田市 事業内容：ヘルプカードやハート・プラスマークの配布など、「見えにくい障がい」への理解の促進 （基本構想 92 ページ） ・ 障害福祉課等での配布 ヘルプマーク
----------------------	--
